

PROPOSITION · SUITE DE L'AUDIT DU 22 SEPTEMBRE 2026

Rama Logic

Un seul endroit pour le projet *et son argent.*

L'Alternative

MARC POTTIER · MARIE FASSO

■ Sylvain Ramaradjou · Architecte Notion & IA · Octobre 2026

CONFIDENTIEL · PRÉPARÉ POUR L'ALTERNATIVE

SOMMAIRE

Ce qu'on va voir *ensemble*

8 SECTIONS, DU CONSTAT À L'OFFRE.

01	Ce qu'on a vu	L'atelier du 22 septembre, et les chiffres de Marie.	→
02	Ce que j'y vois	Furious n'a pas échoué pour la raison qu'on croit.	→
03	Furious ou Notion	Le périmètre d'abord, l'outil ensuite.	→
04	Le système cible	Le flux de l'agence, et où vit chaque donnée.	→
05	Le chemin	Un lot ferme, une option, une validation entre les deux.	→
06	Calendrier	Neuf semaines, et le temps que ça vous demande.	→
07	Engagements	Ce sur quoi vous pouvez compter.	→
08	Offre	L'investissement, sans surprise.	→

01 / 08

Ce qu'on a vu

L'atelier du 22 septembre, et les chiffres de Marie.

■ 01 · CE QU'ON A VU

3,5 M€ pilotés *sur des fichiers Excel*

FACTURÉ SUR 12 MOIS

3,5 M€

3 505 737 € HT du 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026.

PROJETS GAGNÉS PAR AN

≈ 93

70 gagnés sur les 9 premiers mois de 2026, soit environ 23 par cheffe de projet et par an.

VERSIONS DU MÊME BUDGET

jusqu'à 4

Quatre budgets et quatre plans de charge Excel sur un même dossier, ressaisis à chaque étape.

→ Le fichier que vous appelez « la colonne vertébrale » de l'agence est un Excel, remis à jour à la main chaque semaine.

■ 01 · CE QU'ON A VU

Quatre frictions, *vues à l'écran*


 Le budget vit en Excel	Autant de versions que d'avenants. Il ne s'importait pas dans Furious il y a trois ans, et l'habitude est restée.	RESSAISIE À CHAQUE ÉTAPE
 Les provisions ne bougent pas	Le prix d'achat réel ne remplace jamais l'estimation du devis. La trésorerie se reconstruit à côté.	TRÉSORERIE REFAITE À LA MAIN
 Pas de numéro de commande	Une facture fournisseur sans numéro ne se rattache à aucun projet. Les tickets passent par WhatsApp.	RESSAISIE FACTURE PAR FACTURE
 La production démarre sans bon de commande	« On a des OP de mai, on n'a toujours pas les PO. » Puis 60 jours de délai de paiement.	TRÉSORERIE IMMOBILISÉE



Et une échéance : Rachel part fin octobre. Ce qu'elle sait des prestataires et des lieux **n'est pas dans une base interrogeable**, et la dernière mise à jour a un an.

■ 01 · CE QU'ON A VU

Ce que ça coûte, *en temps*

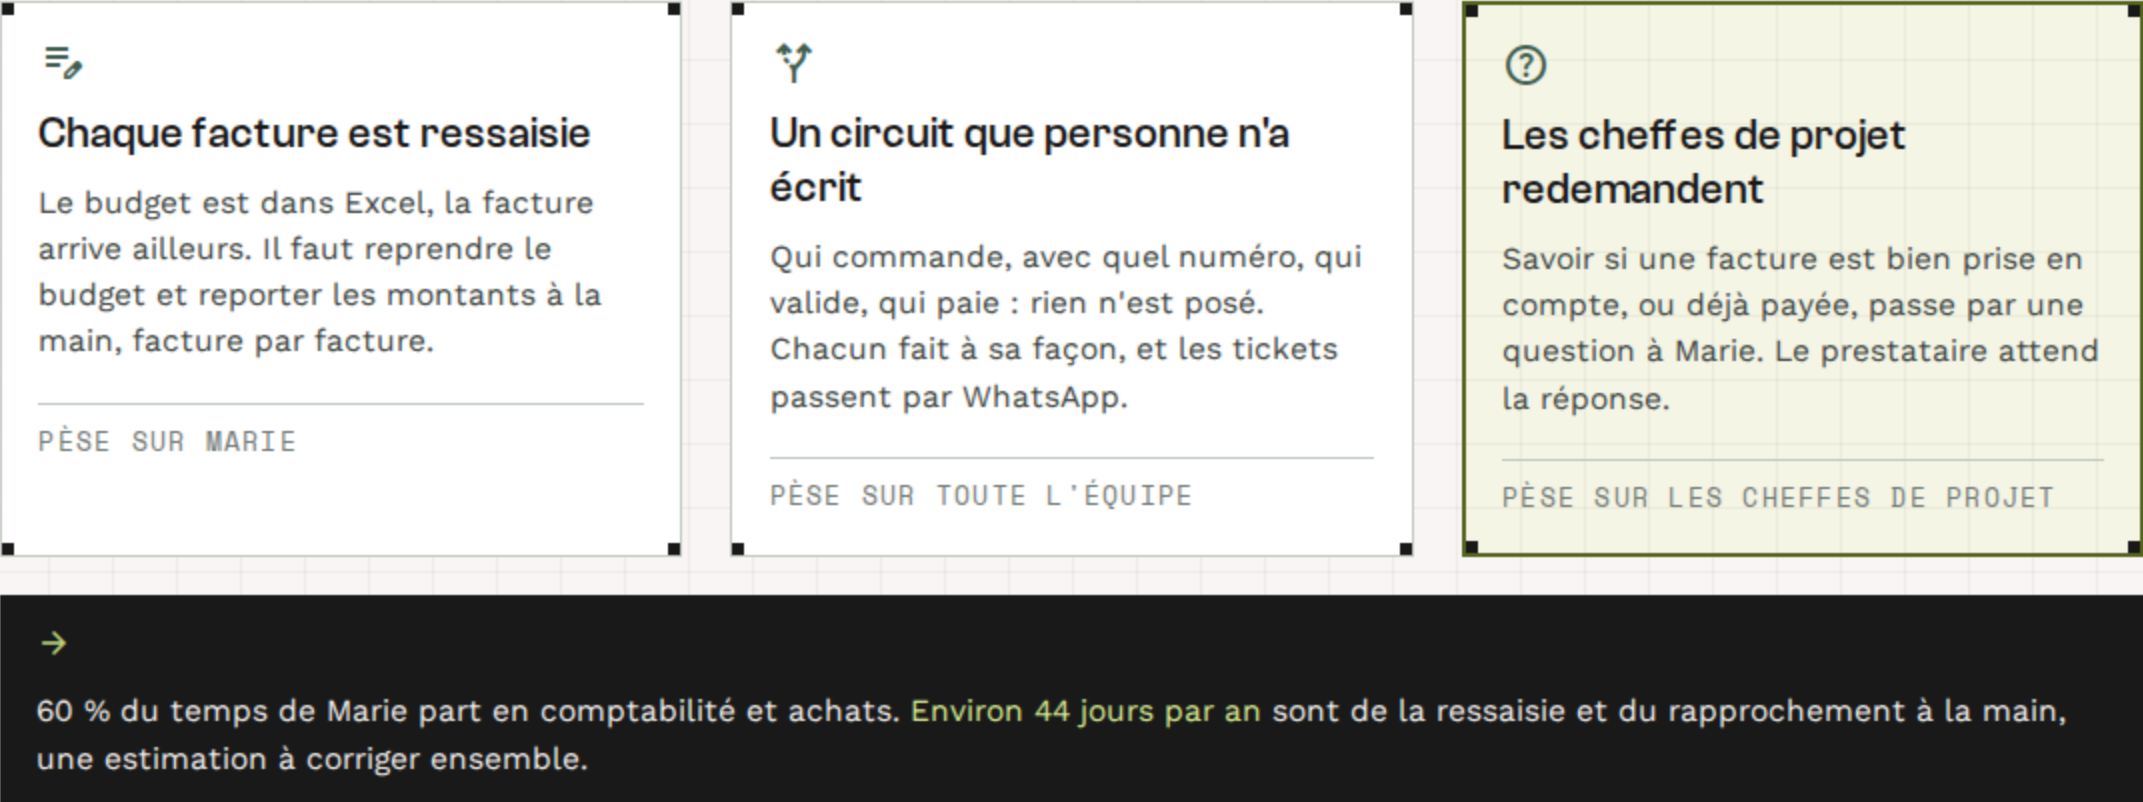

02 / 08

Ce que j'y vois

Furious n'a pas échoué pour la raison qu'on croit.

■ 02 · CE QUE J'Y VOIS

Le blocage est *mécanique*, pas culturel

LA CAUSE RACINE

La même information vit à trois endroits : le budget Excel de la cheffe de projet, Furious chez Marie, et le fichier de trésorerie.

L'équipe n'a pas refusé Furious. Trois verrous l'ont arrêtée : un budget Excel de plusieurs centaines de lignes qui ne s'importait pas à l'époque, un devis figé dès qu'il devient projet, des provisions qui ne suivent jamais le prix réel. Marie pense que l'import serait plus simple aujourd'hui : c'est à revérifier, les deux autres verrous sont confirmés.

SI RIEN NE CHANGE

Rachel part fin octobre. Sa méthode, ses prestataires, ses lieux : c'est maintenant qu'il faut les récupérer.

Chaque facture continue d'être ressaisie, et chaque cheffe de projet de redemander où en est la sienne.

L'équipe se renouvelle : chaque dossier continue de dépendre de la personne qui le tient.

→ La question n'est donc pas « comment mieux utiliser Furious », mais où doit vivre le projet.

03 / 08

Furious ou Notion

Le périmètre d'abord, l'outil ensuite.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

Quatre périmètres, *pas un seul outil*

Avant-vente Contacts, briefs, recos, opportunités.	AUJOURD'HUI Le téléphone et la boîte mail de Marc, Brevo, la base Let's Grow.	DEMAIN Notion
Gestion de production Projet, budget, achats, prestataires, planning.	AUJOURD'HUI Excel, Dropbox, WhatsApp. Furious ne répond pas à ce périmètre.	DEMAIN Notion
Temps et rentabilité Temps passés, marge par projet.	AUJOURD'HUI Furious, et c'est ce qui y marche le mieux.	DEMAIN Notion, au même endroit que le budget
Facturation et comptabilité Facture électronique, banque, comptabilité.	AUJOURD'HUI Furious.	DEMAIN Pennylane, avec votre cabinet

→ Le sujet de l'audit, c'est la deuxième ligne. C'est sur elle que se compare Furious et Notion.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

La gestion *de production*

Ce qui a été montré à l'écran le 22 septembre, sujet par sujet.

SUJET	FURIOUS AUJOURD'HUI	NOTION, SYSTÈME CIBLE
Opportunité et projet	UN SEUL OBJET Le devis devient projet, puis ne se modifie plus.	À CONSTRUIRE Deux objets reliés : l'opportunité avant l'accord, le projet après.
Budget	DEVIS FIGÉ Import d'un budget Excel : impossible il y a 3 ans, à revérifier.	OUI Import du fichier Excel, versions V1, V2, V3 sur les mêmes lignes.
Achats et commandes	PARTIEL Rattachement seulement si le numéro de devis figure sur la facture.	À CONSTRUIRE Commande numérotée, achat rattaché à sa ligne de budget.
Provision et prix réel	NON La provision reste celle du premier devis.	À CONSTRUIRE Le réel se met à jour, alerte au-delà d'un seuil.
Rétroplanning	EXISTE L'onglet tâches est là. En nous le montrant : « on ne l'utilise pas ».	OUI Tâches datées, modèle par format d'événement calculé à rebours.
Annuaire prestataires et lieux	NON VÉRIFIÉ Base fournisseurs comptable, sans qualification métier connue.	À CONSTRUIRE Qui a fait quoi, pour combien, avec quel retour.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

L'outil *au quotidien*

SUJET	FURIOUS AUJOURD'HUI	NOTION, SYSTÈME CIBLE
IA dans l'outil	ANNONCÉ Deux assistants : saisie des temps et rapprochement.	OUI Recherche sur tout l'espace, notes de réunion, assistants sur mesure.
Automatisations	NON VU	À CONSTRUIRE Une opportunité gagnée devient un projet en une minute : fiche, budget type, rétroplanning.
Temps passés	OUI Saisie hebdomadaire avec relances.	À RECONSTRUIRE Saisie plus rustique, lue au même endroit que le budget et les achats.
Écrans par rôle	OUI Tableaux de bord personnalisables, vus le 22/09.	OUI Une vue par rôle sur les mêmes données, à jour.
Externes et prestataires	NON VÉRIFIÉ Une licence par accès, environ 50 € d'après Marc.	OUI Invités limités à leurs pages. Vos deux prestataires y travaillent déjà.
Prix	354 € par mois, tous modules compris.	Environ 20 € par personne et par mois, IA comprise : autour de 180 € par mois à 9. À confirmer.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

La partie IA

« Non vu » veut dire : ni montré à l'atelier, ni confirmé par l'éditeur. Pas « n'existe pas ».

SUJET	FURIOUS AUJOURD'HUI	NOTION, SYSTÈME CIBLE
Interroger les recos et les budgets passés	NON VU	OUI Recherche IA sur tout l'espace, dès que les documents y vivent.
Compte rendu de réunion transformé en tâches	NON VU	OUI Notes de réunion IA intégrées.
Lire une facture et proposer le projet	PARTIEL Un assistant de rapprochement existe.	À CONSTRUIRE Un assistant sur mesure, branché sur vos lignes de budget.
Aider à saisir les temps	ANNONCÉ Présenté à Marie par l'éditeur.	À CONSTRUIRE Plus rustique. Seul point où Furious est devant.
Brancher Claude, ChatGPT ou Copilot sur vos données	NON VÉRIFIÉ Pas d'information publique, pas de retour de l'éditeur à ce jour.	OUI Connecteurs officiels.
Assistants sur mesure qui tournent seuls	NON VU	OUI Sur déclencheur : relance préparée, contrôle avant clôture.

■ 03 · FURIOUS OU NOTION

Le verdict : *chaque outil à sa place*

NOTION PORTE Le métier Les opportunités, les projets, le budget, les achats, les prestataires, le planning et les temps. Un identifiant unique suit le dossier de l'opportunité à la facture.	PENNYLANE PORTE Le légal La facture électronique et la comptabilité, avec votre cabinet. Marie y émet l'acompte et le solde.	FURIOUS En transition Il tient la facturation tant que Pennylane n'a pas pris le relais. Sa place se décide ensuite.
DIT FRANCHEMENT Sur les 35 besoins de l'atelier, Furious en couvre 9, dont 8 vus à l'écran, et 17 n'ont pas pu être vérifiés. Notion en couvre 31, dont 21 sont à construire. Ce qu'on perd : le devis généré par l'outil et le confort de saisie des temps de Furious.		

04 / 08

Le système cible

Le flux de l'agence, et où vit chaque donnée.

■ 04 · LE SYSTÈME CIBLE


Le flux de l'agence, *et où vit la donnée*

OPPORTUNITÉ · AVANT L'ACCORD			PROJET · APRÈS L'ACCORD		
OPPORTUNITÉ · 1 Brief AUJOURD'HUI Téléphone et boîte mail de Marc DEMAIN Fiche opportunité, source tracée	OPPORTUNITÉ · 2 Reco et budget AUJOURD'HUI PowerPoint, Excel, Dropbox DEMAIN Budget en lignes, versions V1 à V3	OPPORTUNITÉ · 3 Accord client AUJOURD'HUI Mail de principe, bon de commande tardif DEMAIN Cadre contractuel visible, projet créé en une minute	PROJET · 4 Production AUJOURD'HUI Excel, WhatsApp, rétroplanning figé DEMAIN Commandes, achats, tâches datées	PROJET · 5 Jour J AUJOURD'HUI Roadbook refait à la main, tickets sur WhatsApp DEMAIN Roadbook et tickets dans le projet	PROJET · 6 Clôture et solde AUJOURD'HUI Furious, fichier de trésorerie DEMAIN Marge réelle dans Notion, facture dans Pennylane

→ Aujourd'hui la donnée change d'endroit à chaque étape. Demain elle reste au même endroit, et c'est le dossier qui avance.

■ 04 · LE SYSTÈME CIBLE

L'architecture : *un projet, tout autour*

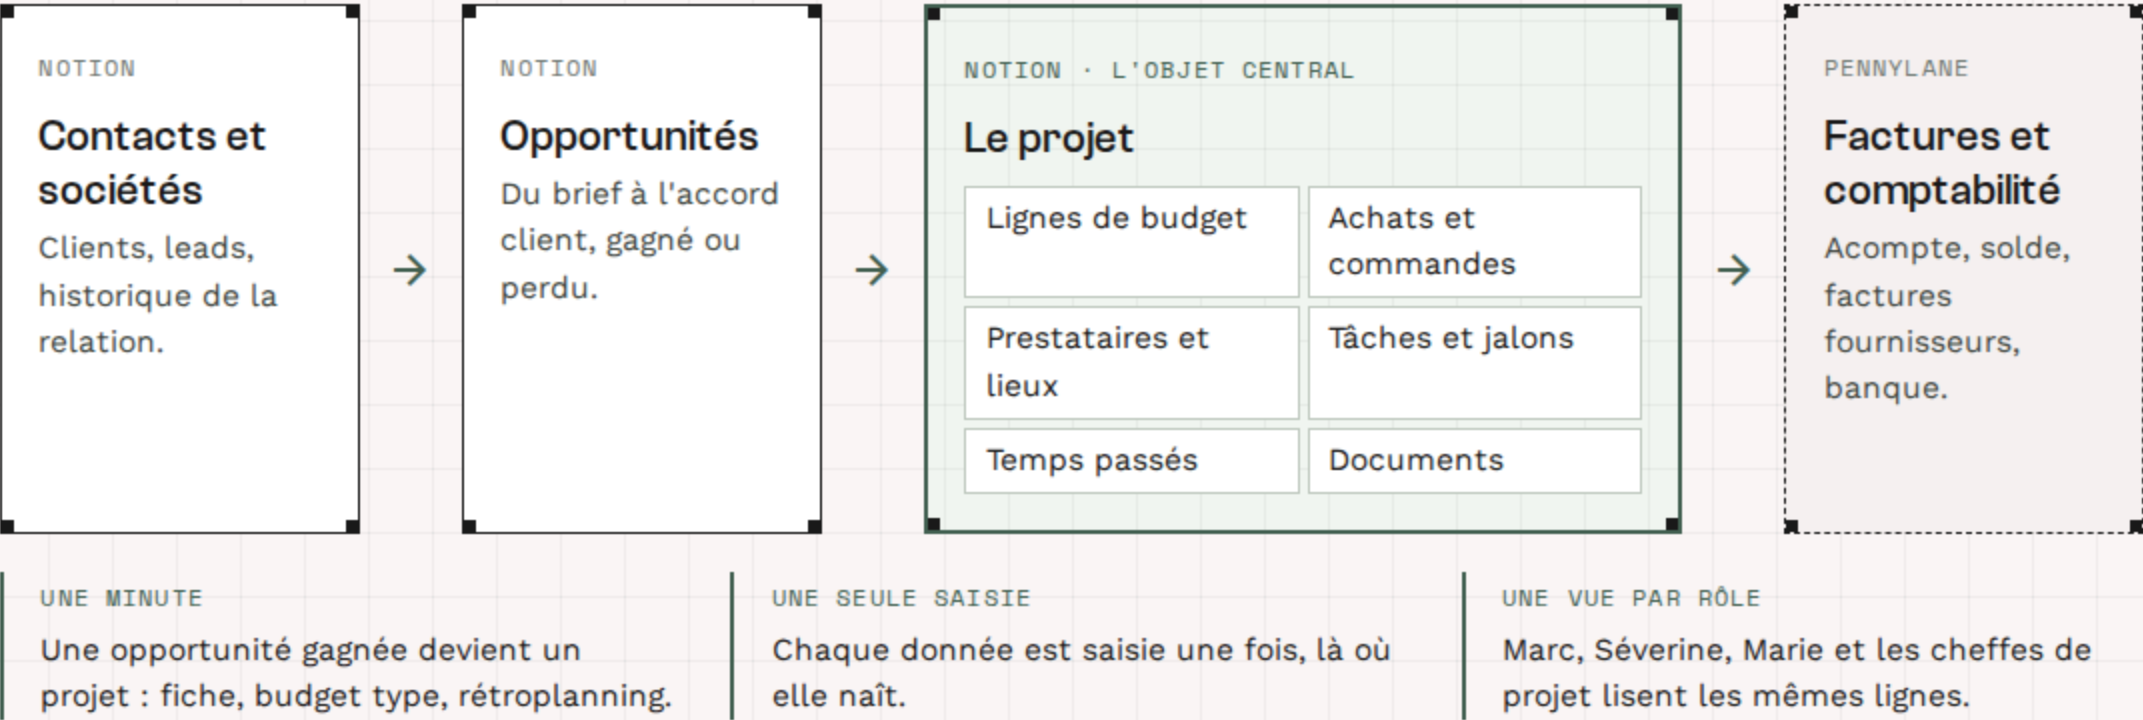

■ 04 · LE SYSTÈME CIBLE

Les outils *qu'on réunit*

OUTIL	AUJOURD'HUI	DEMAIN	CE QU'ON GAGNE
Excel de budget et de plan de charge	Jusqu'à 4 versions par dossier, recalculées à la main.	Lignes de budget dans le projet, calculs faits par le système.	La ressaisie à chaque étape
Fichier de suivi hebdomadaire	Reconstruit chaque semaine par Marie et Marc.	Écrans par rôle, à jour en continu.	Environ 44 jours par an, estimation
Dropbox	12 dossiers racine, des droits différents selon les personnes.	Les documents de pilotage vivent dans le projet. Dropbox garde les fichiers lourds.	Un dossier retrouvable par quelqu'un d'autre
WhatsApp	Validations et tickets de caisse photographiés.	Validations et tickets dans le projet. WhatsApp reste pour le terrain.	Plus de validation introuvable
Espaces Notion des prestataires	Deux espaces où Marc va valider chez les autres.	L'agence ouvre le sien et y invite ses prestataires.	Une seule validation, au même endroit
ChatGPT, une licence partagée	Une mémoire commune, mais coupée des données de l'agence.	Une IA branchée sur les projets, les budgets et les prestataires.	Des réponses fondées sur vos chiffres

Vos abonnements pèsent 12 222 € par an, soit 0,35 % du chiffre d'affaires facturé. Le gain n'est pas dans les licences, il est dans le temps.

Ce que centraliser *change*



Moins de temps à se demander

Où en est la facture, quelle version du budget fait foi, qui a validé : la réponse se lit, elle ne se demande plus. C'est du temps rendu à Marie comme aux cheffes de projet.



Une saisie, plusieurs usages

Le budget saisi une fois sert au suivi des achats, à la marge, au planning et à l'écran de Marc. Plus rien n'est recopié d'un fichier à l'autre.



Les agents IA peuvent travailler

Une IA ne sait rien faire de données éparpillées entre Excel, Dropbox et WhatsApp. Sur une donnée centralisée, elle prépare un rapprochement, une relance, un compte rendu.

→ Centraliser n'est pas ranger. C'est ce qui rend le reste possible : le pilotage, l'automatisation, puis l'IA.

05 / 08

Le chemin

Un lot ferme, une option, une validation entre les deux.

■ 05 · LE CHEMIN

Deux lots, *une validation entre les deux*

LOT 01 · ON DÉMARRE ICI

Le projet, son argent, son pilotage

Toute la gestion de production : budget, achats, prestataires, planning, temps, et les écrans par rôle. Livré et utilisé en 9 semaines.



LOT 02 · EN OPTION

Acquisition et suivi commercial

Une base de contacts unique, les leads de Marc tracés, Brevo et Let's Grow réconciliés.

LE LOT 1 SE VALIDE SUR DES CRITÈRES ÉCRITS

VOUS NE VOUS ENGAGEZ QUE SUR LE LOT 1

LOT 01 SUR 02 · 13 OCTOBRE → 11 DÉCEMBRE

Le projet, son argent, *son pilotage*

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE

C'est le périmètre que rien ne couvre aujourd'hui. Tant que le budget, les achats et les temps ne vivent pas au même endroit, chaque facture est ressaisie et les cheffes de projet redemandent où en est la leur. Et c'est ce lot qui récupère la méthode de Rachel avant son départ.

CE QU'ON VA Y FAIRE

- Semaines 1 et 2 : les règles de base (numéro de commande, bon de commande avant engagement, tickets hors WhatsApp) et la méthode de Rachel : ses dossiers, ses prestataires, ses lieux.
- Semaines 3 à 5 : la fiche projet, le budget en lignes importé d'Excel, les commandes, les achats, les alertes d'écart, et le démarrage de la saisie des temps.
- Semaines 6 à 9 : la marge réelle, le rétroplanning type, les écrans par rôle, la formation et la validation.

LIVRABLES

- ✔ Une fiche projet, créée en une minute depuis l'opportunité gagnée

✔ Le budget en lignes, importé d'Excel, versions comprises

✔ Achats, commandes et tickets rattachés, avec un assistant qui propose le projet et la ligne
- ✔ Temps passés et marge réelle par projet

✔ Un rétroplanning type et un écran du matin par rôle

✔ L'annuaire prestataires et lieux, démarré avec Rachel

■ LOT 01 · LA VALIDATION

Ce qui valide *le lot 1*

- 01

100 % des projets suivis dans Notion

Tous les projets en cours et tous les nouveaux, sans exception et sans fichier à côté.
- 02

Une facture fournisseur rattachée sous 48 h

Toute facture qui porte un numéro de commande retrouve son projet et sa ligne de budget en deux jours.
- 03

Le plan de charge refait à la main s'arrête

Marie ne le reconstruit plus chaque semaine : l'écart entre prévu et réel se lit dans le système.
- 04

Les temps saisis par toute l'équipe

Trois semaines de suite dans Notion, et la marge réelle d'un projet clos sort sans retraitement.

→

Ces quatre critères se constatent ensemble en semaine 9. C'est cette validation qui ouvre la suite, pas le calendrier.

LOT 02 SUR 02 · EN OPTION · 3 À 4 SEMAINES

Acquisition et *suivi commercial*

POURQUOI CE SERAIT UTILE

L'essentiel des affaires vient du réseau de Marc, et elles vivent dans son téléphone et sa boîte mail. Let's Grow prospecte sur une base qui ne connaît pas l'historique client. Ce lot est une option : il se décide après le lot 1, sur des faits.

CE QU'ON VA Y FAIRE

1. Réunir les contacts et les sociétés dans une seule base, avec l'historique de facturation.
2. Réconcilier Brevo et la base Let's Grow, et poser les règles d'exclusion.
3. Tracer chaque brief entrant avec sa source, sans ressaisie pour Marc.

LIVRABLES

- ☒ Une base contacts et sociétés unique, reliée aux projets
- ☒ Les règles de prospection : qui on ne rappelle pas, et pourquoi
- ☒ Le rendement de chaque canal, lisible au même endroit

06 / 08

Calendrier

Neuf semaines, et le temps que ça vous demande.

■ 06 · CALENDRIER

Du *13 octobre* au 11 décembre

- 13 OCTOBRE

Démarrage

Lancement avec Marc et Marie, premières règles posées le jour même.
- 13 → 24 OCTOBRE

Les règles de base et le savoir de Rachel

Numéro de commande, tickets, bon de commande. Sa méthode, ses dossiers en cours et ses prestataires sont dans Notion avant son départ.
- 27 OCTOBRE → 14 NOVEMBRE

Le projet et son argent

Fiche projet, budget importé d'Excel, commandes, achats, alertes. Les cheffes de projet basculent leurs projets en cours avec un modèle d'import, les premiers avec moi. La saisie des temps démarre le 9 novembre.
- 17 NOVEMBRE → 4 DÉCEMBRE

Marge et pilotage

Marge réelle, rétroplanning type, écrans par rôle. Formation de l'équipe.
- 7 → 11 DÉCEMBRE

Validation du lot 1

Les quatre critères constatés ensemble. On décide alors de la suite.

■ 06 · CALENDRIER

Ce qu'on attend *de vos équipes*

AU DÉMARRAGE · UNE FOIS

2 h

Le lancement avec Marc et Marie. Et une demi-journée de Rachel avant son départ, sur sa méthode, ses dossiers et ses prestataires.

CHAQUE SEMAINE · MARIE

2 h

Marie porte la donnée réelle. Un point hebdomadaire pour valider ce qui a été construit et corriger ce qui frotte.

TOUTE L'ÉQUIPE · DEUX FOIS

1 h + 1 h

Une formation à la mise en service du budget et des achats, une autre à celle des temps et des écrans.



Un référent côté agence, joignable dans la semaine, et Marc qui ouvre son écran chaque matin. **Le reste, c'est nous.**

07 / 08

Engagements

Ce sur quoi vous pouvez compter.

Ce sur quoi vous pouvez *compter*



Adoption garantie

Tant que l'équipe n'utilise pas le système au quotidien, je continue l'accompagnement sans facturation supplémentaire sur le périmètre livré, dès lors que le référent, les points hebdomadaires et les formations sont tenus.



Délais tenus

Chaque livrable a une date. Si elle doit bouger, vous le savez 48 h avant, pas le jour même.



Transparence totale

Un point chaque semaine, un espace partagé à jour en permanence, une réponse sous 24 h.

08 / 08

Offre

L'investissement, sans surprise.

■ 08 · OFFRE

Le projet, son argent, son pilotage

13 octobre → 11 décembre 2026

LOT 1 · AU FORFAIT

9 800 €_{HT}

Livré et utilisé en 9 semaines. 100 % des projets suivis dans Notion.

PAIEMENT

50 % à la commande, 50 % à la validation du lot.

INCLUS DANS LE LOT 1

✓

Projet créé depuis l'opportunité, budget en lignes, achats et commandes

✓

Rétroplanning type, écrans par rôle, assistant de rapprochement

✓

Formation de toute l'équipe

✓

Temps passés et marge réelle par projet

✓

Annuaire prestataires et lieux, démarré avec Rachel

✓

Adoption garantie sur le périmètre livré

LOT 2 · EN OPTION

Acquisition et suivi commercial. À décider après la validation du lot 1.

3 500 €_{HT}



HORS FORFAIT : L'ABONNEMENT NOTION, OFFRE BUSINESS, ENVIRON 20 € PAR PERSONNE ET PAR MOIS, À CONFIRMER · LA MISE EN SERVICE DE PENNYLANE SE FAIT AVEC VOTRE CABINET · CONFIDENTIEL, PRÉPARÉ POUR L'ALTERNATIVE.

Merci Marc, merci Marie.

On valide le lot 1, et la méthode de Rachel est dans le système avant la fin du mois.

DATES CLÉS

Validation souhaitée : 9 octobre
Démarrage : 13 octobre 2026

CONTACT

Sylvain Ramaradjou
sylvain@ramalogic.com
