

PLAN D'EXÉCUTION · SYNC DU 20 JUILLET 2026

Rama Logic

Déployer ton Notion et tes premiers agents IA, sans mobiliser tes équipes cet été.

EVMT

JÉRÔME OGOR · DIRECTEUR

■ Sylvain Ramaradjou · Architecte Notion & IA · Juillet 2026

CONFIDENTIEL · PRÉPARÉ POUR EVMT

SOMMAIRE

Ce qu'on va voir *ensemble*

7 SECTIONS, DE L'ÉTAT DES LIEUX À L'OFFRE.

01	Où on en est	Ce qui est validé, ce qui a bougé depuis mai.	→
02	Ce que tes fichiers montrent	La lecture de tes 12 documents internes.	→
03	Ce que j'y vois	La cause racine, et pourquoi l'été est le bon moment.	→
04	Le plan	3 phases, d'août à octobre.	→
05	Roadmap & ton implication	Qui fait quoi, quand, combien d'heures.	→
06	Engagements	Ce sur quoi tu peux compter.	→
07	Offre	L'investissement, sans surprise.	→

01 / 07

Où on en est

Ce qui est validé, ce qui a bougé depuis mai.

■ 01 · OÙ ON EN EST

On ne repart pas de zéro

- 30 AVRIL

Découverte

Ton fonctionnement, ta matrice RACI, l'architecture Notion posée par Paul.
- 7 MAI

Proposition

Le fond validé ensemble. Tes mots : « *On est complètement convaincus de vouloir le faire.* »
- 27 MAI

Timing recalé

Équipes chargées, bascule Google Workspace, congé paternité. Décision : démarrer à la rentrée, avec un référent activable à la demande.
- ▣

11 JUIN

Tes 12 documents internes

Reçus, et analysés en détail.

Ce deck n'est pas un nouveau pitch. C'est le plan d'exécution.

02 / 07

Ce que tes fichiers montrent

La lecture de tes 12 documents internes.

■ 02 · CE QUE TES FICHIERS MONTRENT

Tout vit dans des classeurs

/PIPELINE

580 dossiers

Suivis dans un Excel depuis 2019. 79% de taux de gain, mais zéro alerte, zéro vue temps réel.

/BUDGETS

Une trame à macros

Des dossiers à plusieurs milliers de lignes. Chaque nouvelle version recopiée à la main.

/ÉQUIPES

20 collaborateurs

La protection de tes équipes se gère cellule par cellule, chaque semaine.

/MATÉRIEL

159 Mo

Un fichier avec photos pour suivre le stock et les pertes.

LA MÊME INFORMATION EST RESSAISIE 4 À 5 FOIS : DEVIS, BUDGET, COMPTE DE PRODUCTION, FACTURATION.

■ 02 · CE QUE TES FICHIERS MONTRENT

Deux risques silencieux

 LA VERSION AGENCE

Avant chaque envoi client, il faut supprimer à la main les colonnes de coûts et de marge. Un oubli sur un dossier à 6 chiffres, et ta marge est sur la table.

 LE PILOTAGE

Ton fichier de suivi contient des formules cassées. Les décisions de recrutement et de rentabilité s'appuient sur des chiffres fragiles.

DEUX RISQUES QU'UN ESPACE UNIQUE ET À JOUR FAIT DISPARAÎTRE PAR CONSTRUCTION.

03 / 07

Ce que j'y vois

La cause racine, et pourquoi l'été est le bon moment.

■ 03 · CE QUE J'Y VOIS

Ta donnée n'a pas de maison

 LA CAUSE RACINE

Ta donnée n'a pas de maison. Chaque classeur est une copie de la vérité : dossiers, budgets, temps, stock. Personne ne triche, mais tout le monde ressaisit, et rien ne se recoupe tout seul.

 SI RIEN NE CHANGE

Ta vision 2030, c'est x4 en chiffre d'affaires avec x2 en effectif. Avec le fonctionnement actuel, ça veut dire 4 fois plus de classeurs, les mêmes ressaisies, et toujours tes 60 heures par semaine.

■ 03 · CE QUE J'Y VOIS

Pourquoi l'été est le bon moment

JUSQU'À FIN JUILLET	Tes équipes sont sous l'eau : on ne leur demande rien.
AOÛT	Je construis en silence sur l'architecture existante. Zéro réunion d'équipe, zéro formation, zéro perturbation.
LA RENTRÉE	Elles découvrent un outil prêt, testé sur vos vrais dossiers. Pas une page blanche.

Le déploiement raté, c'est celui qu'on fait en pleine saison. Celui-là se prépare pendant que ça dort.

04 / 07

Le plan

3 phases, d'août à octobre.

■ 04 · LE PLAN

3 phases, d'août à octobre

1

PHASE 1 · AOÛT

Construction
silencieuse

Je bâtis la fondation sur l'existant, sans solliciter tes équipes.

2

PHASE 2 · SEPTEMBRE

Déploiement &
adoption

Kickoff, formation, migration de 100% des projets actifs.

3

PHASE 3 · OCTOBRE

Référent IA à la
demande

L'amélioration continue, activable via Slack.

10 SEMAINES JUSQU'À L'ADOPTION COMPLÈTE

■ PHASE 1 SUR 3 · AOÛT

Construction silencieuse

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE

L'architecture de Paul est bonne, mais vide. Sans fondation activée et testée sur tes vrais dossiers, la rentrée repartirait d'une page blanche : exactement ce qui a bloqué le premier lancement.

CE QU'ON VA Y FAIRE

1. Activer l'architecture Notion existante et y intégrer ta matrice RACI (validée à 95%).
2. Relier dossier, budget, compte de production et facturation dans une base projets unique.
3. Construire le prototype de la trame briefs IA et le tester sur tes vrais briefs passés.

LIVRABLES

- ☑

Espace Notion opérationnel : base projets unique + 4 dashboards par rôle (direction, responsables, CDP, création)
- ☑

Matrice RACI intégrée dans les vues et les validations
- ☑

Prototype trame briefs IA démontré sur 3 briefs réels EVMT

■ PHASE 2 SUR 3 · SEPTEMBRE

Déploiement & adoption

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE

Un outil prêt ne sert à rien si personne ne monte dedans. Septembre est dédié à une seule chose : que 100% des projets actifs vivent dans Notion, portés par tes 5 responsables.

CE QU'ON VA Y FAIRE

1. Kickoff équipes + formation des 5 responsables « champions », puis onboarding par vagues.
2. Migrer 100% des projets actifs avec les équipes, silo test d'abord.
3. Mettre la trame briefs IA en production sur les briefs entrants.

LIVRABLES

-  100% des projets actifs migrés et utilisés dans Notion
-  2 sessions de formation + SOP écrites + replays vidéo
-  Trame briefs IA en production : les infos manquantes détectées avant le premier échange client

■ PHASE 3 SUR 3 · À PARTIR D'OCTOBRE

Référent IA à la demande

POURQUOI C'EST INDISPENSABLE

C'est le mode que tu as demandé : pas un consultant à demeure, un référent que tes équipes activent quand elles en ont besoin. L'outil vit, s'améliore, et le budget reste sous contrôle.

CE QU'ON VA Y FAIRE

1. Canal Slack dédié : tes équipes posent leurs demandes, je traite.
2. Un quick win par mois, tiré de la roadmap issue de tes fichiers.
3. Comité mensuel de 45 min avec toi : priorités, mesure, arbitrages.

LIVRABLES · ROADMAP INDICATIVE

- ☑

Génération automatique de la version client des budgets (fin du nettoyage manuel)
- ☑

Plan de charge équipes avec alertes de surcharge
- ☑

Inventaire matériel et compte de production reliés au reste

■ 04 · LE PLAN · ZOOM

Le premier livrable : la fin des briefs incomplets



« C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Ça fait huit ans qu'on fait ça. »

TOI, LE 27 MAI

01 Le brief client arrive : mail, PDF, notes d'appel.



02 L'IA le passe au crible de la trame EVMT : budget, dates, lieux, effectifs, contraintes techniques, livrables attendus.



03 Ton CDP reçoit la liste exacte des infos manquantes, avant le premier échange client.

1 à 3 h

recupérées par projet

SUR ~150 DOSSIERS GAGNÉS PAR AN (ESTIMATION BASÉE SUR TON SUIVI 2025)


05 / 07

Roadmap & ton implication

Qui fait quoi, quand, combien d'heures.

05 · ROADMAP

Calendrier de la reprise

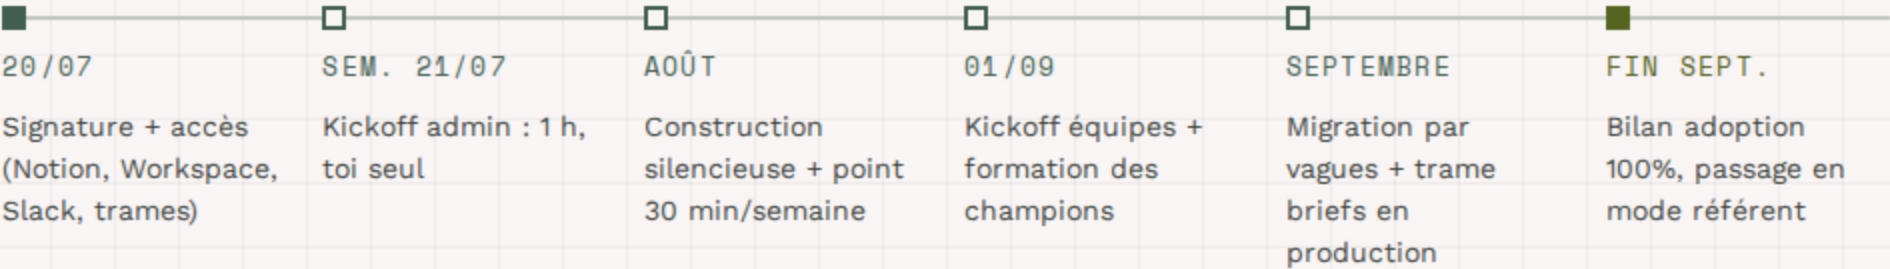

■ 05 · TON IMPLICATION

Ce qu'on attend de toi (et de tes équipes)

AU DÉMARRAGE · UNE FOIS

1h

Kickoff admin + les accès.
Faisable pendant ton congé, ou
on décale de quelques jours.

EN AOÛT · RÉCURRENT

30 min/sem

Un point d'avancement, toi
seul.

EN SEPTEMBRE · ÉQUIPES

2 sessions

Kickoff + formations, pour les 5
responsables puis les équipes.

C'est tout. Le reste, c'est moi.

06 / 07

Engagements

Ce sur quoi tu peux compter.

Ce sur quoi tu peux compter



Délais tenus
Chaque livrable arrive au jour prévu. Si ça glisse, tu le sais 48 h avant, pas le jour J.



Transparence totale
Un point de 30 min par semaine, un espace partagé à jour en temps réel, une réponse sous 24 h.



Exigence de résultats
Le critère de succès n'a pas changé : 100% des projets actifs dans Notion, utilisés par les équipes. Si un livrable ne correspond pas au brief validé, je reprends sans surcoût.

07 / 07

Offre

L'investissement, sans surprise.

■ 07 · OFFRE

L'investissement

SPRINT FONDATION · AOÛT → FIN SEPTEMBRE

8 400 € HT INCHANGÉ DEPUIS MAI

✓ Fondation Notion + base projets unique

✓ Trame briefs IA en production

✓ 2 formations + SOP + replays vidéo

✓ 4 dashboards par rôle

✓ Migration 100% des projets actifs

✓ Suivi hebdo

MODALITÉS

50% à la signature · 50% à la livraison (fin septembre)

RÉFÉRENT IA · OPERATE · À PARTIR D'OCTOBRE

1 500 € HT/mois

3 MOIS MIN., PUIS MENSUEL

✓ Canal Slack dédié

✓ 1 quick win par mois

✓ Comité mensuel 45 min

La trame briefs seule : 1 à 3 h récupérées par projet, sur ~150 dossiers par an.

CONFIDENTIEL · PRÉPARÉ POUR EVMT

Merci Jérôme.

On signe, et je commence pendant que tes équipes finissent leur saison.

DATES CLÉS

Signature : 20/07 · Kickoff admin : semaine du
21/07 · Kickoff équipes : 01/09

✉ sylvain@ramalogic.com

On avance ensemble ?

CONFIDENTIEL · PRÉPARÉ POUR EVMT
